


Palazzo Gerini  
via M. Buonarroti, 10 Firenze

*Progetto Definitivo  
per la Manutenzione ordinaria e straordinaria  
degli Uffici ex IRRE Lazio,  
in via Guidubaldo Del Monte, 54 Roma*




Studio di Architettura Efsio Corongiu  
Via del Collegio n.28 - 09124 Cagliari  
Ordine degli Architetti Prov. di Cagliari  
n. 196  
e-mail [efsiocorongiu@gmail.com](mailto:efsiocorongiu@gmail.com)



<p>Il Committente INDIRE</p>	<p>Il Direttore Generale Dott. Flaminio Galli</p>	<p>DATA Maggio 2015</p>
<p>Il Progettista Arch. Efsio Corongiu</p>	<p>Il R.U.P. Avv. Valentina Cucci</p>	<p>AGG.TO</p>
<p>Oggetto  <i>Cronoprogramma dei lavori</i></p>		<p>elaborato <b>I</b></p>

Allegato II - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

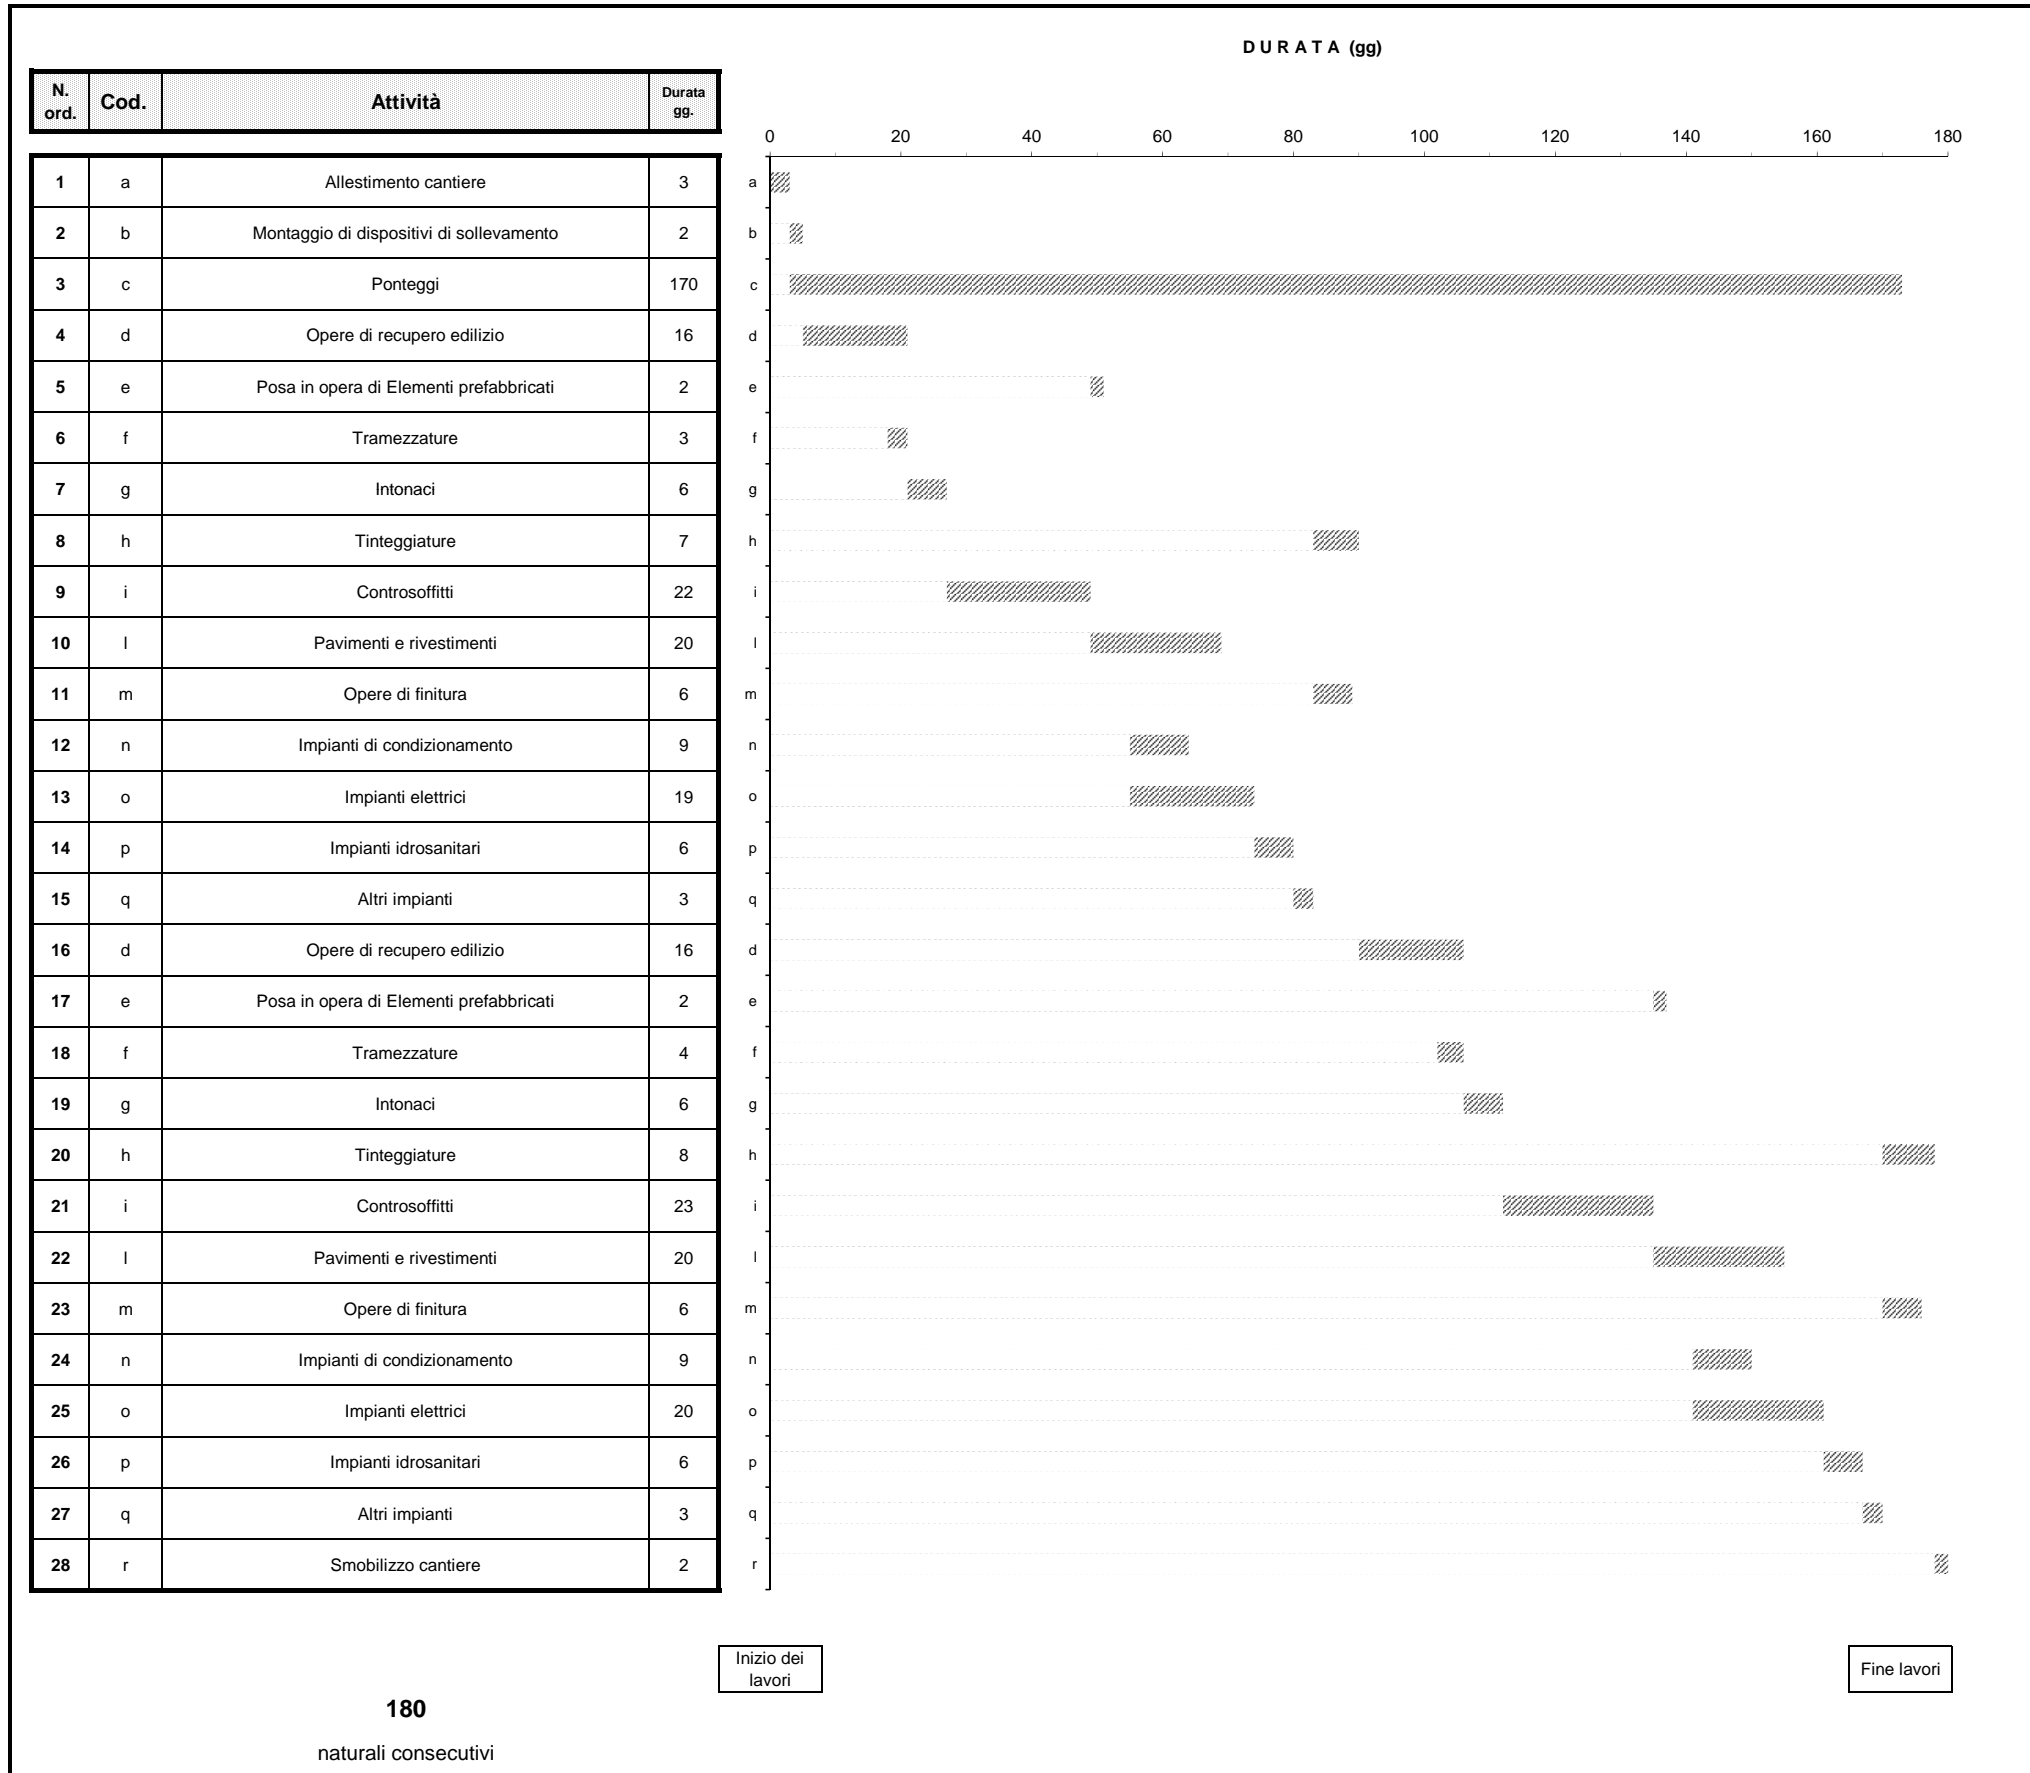

# **ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ DI CANTIERE**

È da premettere che le lavorazioni da eseguirsi nei due piani del cantiere di Via Guidubaldo Del Monte 54, dovranno svolgersi in due tempi diversi.

Prima si eseguiranno per intero i lavori del 5° piano e poi quelli del 4°, al fine di non interrompere l'attività lavorativa della struttura committente, così come da cronoprogramma dei lavori.

<b>Data Inizio</b>	
<b>Data Fine</b>	
<b>Durata interferenza (giorni)</b>	3

<b>Fase Lavorativa</b>	<b>Impresa/Lavoratore autonomo</b>
Opere di recupero edilizio	
Tamponature e Tramezzature	

<b>Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:</b>	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

<b>Compatibilità delle Attività Interferenti</b>	Le lavorazioni non sono tra loro compatibili - obbligo dello sfasamento temporale e/o spaziale.
<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	<p>Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.</p> <p>Coordinare le lavorazioni con le maestranze presenti in cantiere al fine di prevenire i rischi connessi alle singole lavorazioni.</p>
<b>Documenti di riferimento</b>	<p>Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche).</p> <p>Verbale Riunione di Coordinamento.</p> <p>Verbali di Ispezione e Verifica in Cantiere.</p>

<b>Data Inizio</b>	
<b>Data Fine</b>	
<b>Durata interferenza (giorni)</b>	3

<b>Fase Lavorativa</b>	<b>Impresa/Lavoratore autonomo</b>
Posa in opera di Elementi prefabbricati	
Pavimenti e rivestimenti	

<b>Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:</b>	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

<b>Compatibilità delle Attività Interferenti</b>	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati.
<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.
<b>Documenti di riferimento</b>	Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche). Verbale Riunione di Coordinamento. Verballi di Ispezione e Verifica in Cantiere.

<b>Data Inizio</b>	
<b>Data Fine</b>	
<b>Durata interferenza (giorni)</b>	10

<b>Fase Lavorativa</b>	<b>Impresa/Lavoratore autonomo</b>
Pavimenti e rivestimenti	
Impianti di condizionamento	
Impianti elettrici	

<b>Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:</b>	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

<b>Compatibilità delle Attività Interferenti</b>	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati.
<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	<p>Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.</p> <p>Coordinare le lavorazioni con le maestranze presenti in cantiere al fine di prevenire i rischi connessi alle singole lavorazioni.</p>
<b>Documenti di riferimento</b>	<p>Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche).</p> <p>Verbale Riunione di Coordinamento.</p> <p>Verbal di Ispezione e Verifica in Cantiere.</p>

<b>Data Inizio</b>	
<b>Data Fine</b>	
<b>Durata interferenza (giorni)</b>	5

<b>Fase Lavorativa</b>	<b>Impresa/Lavoratore autonomo</b>
Pavimenti e rivestimenti	
Impianti elettrici	

<b>Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:</b>	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

<b>Compatibilità delle Attività Interferenti</b>	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati.
<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	<p>Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.</p> <p>Coordinare le lavorazioni con le maestranze presenti in cantiere al fine di prevenire i rischi connessi alle singole lavorazioni.</p>
<b>Documenti di riferimento</b>	<p>Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche).</p> <p>Verbale Riunione di Coordinamento.</p> <p>Verballi di Ispezione e Verifica in Cantiere.</p>

<b>Data Inizio</b>	
<b>Data Fine</b>	
<b>Durata interferenza (giorni)</b>	6

<b>Fase Lavorativa</b>	<b>Impresa/Lavoratore autonomo</b>
Opere di finitura	
Tinteggiatura (interni ed esterni)	

<b>Interferenza dovuta a utilizzo contemporaneo di:</b>	Mezzi e Attrezzature	NO
	Servizi	NO
	Apprestamenti di Sicurezza	NO
	Prodotti Usati	NO
	Aree di lavoro	SI
	Vie di accesso, piazzali e parcheggi	NO
	Aree di stoccaggio	NO

<b>Compatibilità delle Attività Interferenti</b>	Le lavorazioni sono tra loro compatibili adottando le misure di prevenzione e protezione predisposte dai documenti della sicurezza di cantiere accettati ed approvati.
<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>	<p>Informare le maestranze operanti in cantiere riguardo i lavori e l'ubicazione degli stessi.</p> <p>Coordinare le lavorazioni con le maestranze presenti in cantiere al fine di prevenire i rischi connessi alle singole lavorazioni.</p>
<b>Documenti di riferimento</b>	<p>Verbale di Formazione (obbligo di informazione ai lavoratori per le attività specifiche).</p> <p>Verbale Riunione di Coordinamento.</p> <p>Verballi di Ispezione e Verifica in Cantiere.</p>
